




T.C.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ

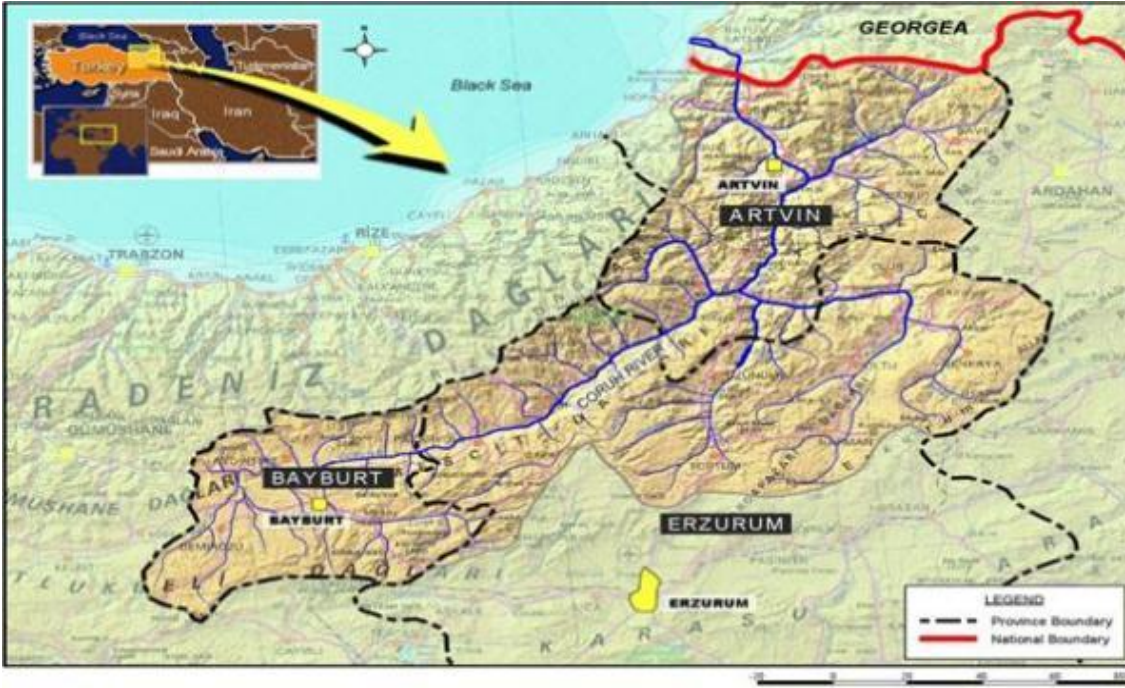

2018 MAYIS AYI AYLİK ÇALIŞMA RAPORU

{PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK: S-1B}

Haziran 2018 Ankara



İÇİNDEKİLER

1-GENEL	3
2- S-1B DANIŞMANININ PROJE KAPSAMINDA MAYIS 2018 AYI İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ FAALİYETLER	4
2.1. Büro Çalışmaları.....	4
2.2.Toplantılar, Seyahatler, Raporlamalar	8
3-S-1B UZMANLARINCA 2018 YILI İÇİNDE PROJEDE YAPILMASI PLANLANAN ÇALIŞMALAR... ..	10
4- EKLER	12

EKLER:

Ek-1: Mayıs 2018- Ağustos 2018 Kısa Dönem Ödeme Tahminleri tablosu

Ek-2: Proje 2018 yılı Uzun dönem ödeme tahminleri tablosu (Long Term Disbursement-LTD)
Güncel

Ek-3: 2018 Nisan ayı Aylık Faaliyet Raporu

Ek-4: Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi 2012-2019 programları ile 2012-2017 yılı gerçekleştirmeleri

Ek-5: Erzurum OBM toplu sera dalgıç pompa talebi

Ek-6: Erzurum OBM yazışmaları

Ek-7: Trabzon OBM ilave köy talep yazışmaları

Ek-8: TRGM ilave faaliyet talep yazışmaları

Ek-9: OGM Dış İlişkiler DB Proje Yıllık Değerlendirme Toplantısı Bilgilendirme yazısı

Ek-10: OGM Proje illeri 2018 yılı faaliyetleri yazışmaları

Ek-11: Trabzon OBM Proje Bayburt 2018 faaliyetleri yazışmaları

Ek-12: Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında Artvin ve Erzurum Bilgi Notu

1- GENEL

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi, 2012-2019 yılları arasında, Bayburt'ta 2, Erzurum'da 7 ve Artvin'de 4 olmak üzere seçilen toplam 13 Mikro-havzada uygulanacak olup, doğal kaynakların korunması, rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetimi ile köylülerin geçiminin iyileştirilmesini ve kapasite geliştirme faaliyetlerini kapsamaktadır. Bütçesi toplam 6,15 milyar Japon Yeni olup bunun 4,225 milyarı dış katkıdır.

Projenin genel amacı Çoruh Nehri Havzasında, entegre rehabilitasyon ve bitki örtüsü, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve muhtelif gelir getirici faaliyetlerle geçimin iyileştirilmesi sayesinde çevresel muhafaza ve fakirliğin azaltılmasına katkıda bulunmaktadır

Proje Orman Genel Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (Projeden çekilmiştir), Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve İl Özel İdareleri tarafından uygulanmaktadır.

Proje kapsamında, üç alanda (S.1 "PYUB'ye Destek", S.2 "Detaylı MH planlama ve dizayn", S.3 "İzleme ve Değerlendirme Sistemi") "Danışmanlık Hizmeti" temin edilmesi öngörülmüş olup, Orman Genel Müdürlüğü ile S-1B Danışmanı (Büyük Anadolu Ormancılık Ltd. Şti.) arasında 08.06.2012 tarihinde "Danışman Hizmetleri Sözleşmesi (Zaman Sınırlı)" imzalanmıştır. Bu doğrultuda, İzleme ve Değerlendirme Uzmanı, Havza Yönetimi Uzmanı, Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı, Sulama Uzmanı ve Proje Asistanı/Tercüman Orman Genel Müdürlüğü'nde "Proje Uzmanı" olarak çalışmaktadır.

Mayıs ayında S-1B uzmanları olarak; MH planlama ve İD çalışmaları, JİCA ve üst yönetime verilecek raporların ilgili bölümlerini hazırlama, üst yönetime yapılacak sunum ve bilgi notu hazırlama, birimler ve danışman firmalarla yapılan proje yazışmaları vb. rutin faaliyetler gerçekleştirilmiş, Proje Koordinatörü, Proje Müdürü ve OGM Proje sorumlusu ile diğer PYUB üyeleri ile irtibat halinde olunmuştur. Proje tanıtım kitapçığı hazırlıklarına devam edilmiş, illerin 2018 yılı faaliyetlerine yönelik talepleri değerlendirilerek cevaplanmıştır.

- Mikrohavza Planları kapsamında yürütülmekte olan uygulamaların takip edilmesi, proje faaliyetlerinin uygulanması konusunda Proje Yönetim Birimi, İl Proje Uygulama Birimleri ve ilgili taraflara yardımcı olunması ve faaliyetler konusunda teknik tavsiye ve önerilerde bulunulması çalışmalarına devam edilmiştir.
- İzleme ve Değerlendirme Sisteminin kurulması, Sosyo Ekonomik Durum Tespiti, Toprak Erozyonu ve Vejetasyon İzleme faaliyetleri ile ilgili rutin çalışmalara devam edilmiştir.
- Proje yönetim/süpervizörlük işleri yerine getirilmiş, Proje Yönetim Birimi, JİCA ve proje paydaşları ile toplantılar, görüşmeler ve gerekli yazışmalar yapılmış, proje tanıtım kitapçığı hazırlama işlemlerine devam edilmiş, içerikleri gözden geçirilmiş, kapasite geliştirme faaliyetleri kapsamında yurtdışı eğitimleri için gerekli yazışmalar, girişimler yapılmış, illerin 2018 yılı faaliyetlerine yönelik talepleri değerlendirilerek cevaplanmıştır.

2- S-1B DANIŞMANININ PROJE KAPSAMINDA 2018 YILI MAYIS AYI İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ FAALİYETLER

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında yürütülecek faaliyetlerle ilgili olarak, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile S-1B Danışmanı (Büyük Anadolu Ormancılık Ltd. Şti.) arasında imzalanan 08.06.2012 tarihli Danışman Hizmetleri Sözleşmesine (Zaman Sınırlı) istinaden; İzleme ve Değerlendirme Uzmanı, Havza Yönetim Uzmanı, Gelir Artırıcı Faaliyetler Uzmanı, Sulama Uzmanı ve Proje Asistanı/Tercüman tanımlanan görevleri ile ilgili olarak Proje Koordinatörü, Proje Müdürü, Proje Yönetim ve Uygulama Birimi üyeleri ile sürekli irtibat halinde olmakta, proje kapsamında yapılan ve yapılacak faaliyetlerle ilgili gün içindeki gelişmelere uzmanlıkları çerçevesinde katkı sağlamakta, teknik yönlendirme ve bilgilendirme görevlerini gerçekleştirmekte, yapılan çalışmalara, toplantılara katılım sağlamaktadırlar. Dönemsel çalışmalarını tamamladığı gerekçesi ile Gelir Artırıcı Faaliyetler Uzmanı Mevlüt Düzgün'ün görevine 30 Kasım 2017 itibarı ile ara verilmiştir. Bu dönemde bu uzmanlara yönelik görevler diğer uzmanlarca gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Yukarıda verilen rutin çalışmaların dışında gerçekleştirilen faaliyetler aşağıdadır:

2.1- Büro Çalışmaları

- ✓ **Proje dokümanları ile “Alt Proje A ve Alt Proje B” faaliyetlerinin detaylı olarak incelenmesi:** Uzmanlar, kendi uzmanlık alanları ile ilgili ve S-2 ve S-3 danışmanlıkları ile ilgili konularda ve gerek duyulduğunda, proje ile ilgili dokümanların detay incelenmesine devam etmişlerdir.
- ✓ **Proje aylık çalışma raporunun (Nisan 2018) hazırlanması:** İdare'ye sunulmuştur.
- ✓ **İş planlaması ve rapor hazırlama:** Yapılan toplantı, seyahat vb.nin raporları hazırlanmıştır.
- ✓ **Proje yazışmaları, Tercüme:** Proje ile ilgili gerekli yazışmaların, tercümelerin, sözlü çevirilerin (simultane, ardıl, fısıltı vb.), vb. yapılması, raporların ve dokümanların hedef dile yazılı çevirilerinin yapılarak JICA ve konuyla ilgili kurumların bilgilendirmesi, Proje dokümanlarının arşivlenmesi işleri Proje Asistanı/Tercüman tarafından gerçekleştirilmiştir.
- ✓ **Mikrohavza uygulama çalışmaları:** 2018 yılı programı kapsamındaki faaliyetlerin uygulanması konusunda Proje Yönetim Birimi, İl Proje Uygulama Birimleri ve diğer ilgili taraflara yardımcı olunması, gerekli olduğunda teknik tavsiye ve önerilerde bulunulması ve uygulamaların takip edilmesi iş ve işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Proje paydaşları ve İl Proje Uygulama Birimleri ile proje faaliyetleri, yıllık programlar ve gerçekleştirmeler, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesi konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulunulmuştur.

- ✓ Proje Tanıtım Kitapçığı'nın ilgili bölümlerinin incelenmesine katkıda bulunulmuştur.
- ✓ Proje Bilgi Notu ve Proje Slayt Sunusu'nun ilgili bölümlerinin hazırlanmasına katkıda bulunulmuştur.

- ✓ Proje uzun dönem ödeme tahminleri tablosunun (LTD) hazırlanması çalışmalarına katkıda bulunulmuştur.
- ✓ Yurtdışı kısa dönem eğitim (teknik gezi) programlarının hazırlanması çalışmalarına katkıda bulunulmuştur.
- ✓ **Gelir Getirici Faaliyetler ve Küçük Ölçekli Sulama Altyapısının İyileştirilmesi Çalışmaları:**
S-1 B danışmanları ile birlikte, PYB tarafından hazırlanması istenilen, ÇNHRP kitapçığı hazırlanması çalışmaları kapsamında; hem Küçük Ölçekli Sulama Faaliyetleri, hem de Gelir Getirici Faaliyetlere ait, resim ve dökümantasyonun temin edilmesi faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

Gelir Getirici Faaliyetlere ait, 2018 yılına kadar yapılan plan ve gerçekleşme tutar ve miktarları ile 2018 yılı programı verilerinin, gerçek rakamlarla denkliliğinin sağlanması için, otomasyon sistemindeki veri girişleri ve daha önce yapılan çalışmalardan faydalanılarak yeniden tablolar hazırlanması çalışması yapılmıştır.

PYB tarafından yapılması istenilen, Küçük Ölçekli Sulama Faaliyetleri ve Gelir Getirici Faaliyetlere ait, eski yeni karşılaştırmasının yapıldığı bir slayt hazırlanması kapsamında çalışmalar yapılmış ve bu konuda istenilen slaytlar hazırlanarak PYB'ne sunulmuştur.

- ✓ **İzleme ve Değerlendirme Sistemi ile ilgili çalışmalar:**
İzleme ve Değerlendirme Sisteminin kurulması, Sosyo Ekonomik Durum Tespiti, Toprak Erozyonu ve Vejetasyon İzleme faaliyetleri ile ilgili rutin çalışmalara devam edilmiştir. İzleme ve Değerlendirme sisteminin OGM'deki mevcut serverlere yüklenmesi için gereken işlemlere yönelik Proje Yönetimi ve OGM BSD nezdinde tekrar girişimde bulunulmuştur.

- ✓ **Proje Yönetim/Süpervizörlük hizmetleri:**
Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında sözleşme gereği Proje süpervizörlük hizmetleri yerine getirilmiş, Mikro Havza Planlama, İzleme ve Değerlendirme Sistemi Danışmanlıkları ile JİCA ve diğer kurumlarla olan yazışmalar, raporlamalar gerçekleştirilmiş, Proje Koordinatörü, Proje Müdürü ve OGM Proje sorumlusu ile diğer PYUB üyeleri ile irtibat halinde olunmuştur. Proje tanıtım kitapçığı hazırlanmasına devam edilmiştir.

- ✓ Kısa Dönem Ödeme Tahminleri tablosu (Mayıs 2018- Ağustos 2018) hazırlanarak JİCA'ya gönderilmiştir. (Ek-1)

JİCA ile 2 ve 9 Mayıs 2018 tarihinde yapılan toplantılarda proje uzun dönem ödeme tahminleri tablosu çalışmaları (Long Term Disbursement (LTD)), Proje durum raporu (PSR) ile yurtdışı eğitimleri görüşülmüştür. Proje 2018 yılı Uzun dönem ödeme tahminleri tablosu (Long Term Disbursement-LTD) güncellenerek tekrar JİCA'ya gönderilmiştir(Ek-2)

JİCA ile proje konusunda görüşmeler, toplantılar, yazışmalar gerçekleştirilmiştir.

- ✓ 2018 Nisan ayı Aylık Faaliyet Raporu hazırlanmış, ilgili yerlere gönderilmiştir. (Ek-3)

- ✓ Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Proje Tanıtım Kitapçığı hazırlanması kapsamında A-Tabi kaynakların Korunması, Rehabilitasyonu ve Sürdürülebilir Yönetimi B-Köylülerin Yaşamının/Geçiminin İyileştirilmesi kapsamında yapılan faaliyetlerin 2012-2019 programları ile 2012-2017 yılı gerçekleştirmeleri 2018 yılı programı Proje Yönetim Birimine gönderilmiştir. (Ek-4)
- ✓ Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü'nün Uzundere İlçesi Altınçanak köyünde yapılan seralara su sağlayacak havuzunda kullanılmak üzere talep ettiği dalgıç pompa ihtiyacı uygun görülmüştür. (Ek-5)
- ✓ S-1B Danışmanları tarafından Nisan ayında gerçekleştirilen arazi seyahati sonrasında hazırlanan arazi seyahat raporu Proje Müdürü'nün talebi doğrultusunda tekrar gözden geçirilmiş, seyahat öncesinde kararlaştırıldığı gibi zaman kısıtı da dikkate alınarak, Danışmanların 4 mikrohavzadaki seçili alanlarda, çığ kontrol alanları dahil, ayrıntılı inceleme (Masat, İspir, Yusufeli, Veliköy) yaptıkları, diğer mikrohavzalarda da raporda belirtilen alanlara ziyaret gerçekleştirdikleri tespit edilmiş, yine kararlaştırıldığı üzere 2015 ve öncesi çalışmaların detaylı incelemesi esas alınmıştır. Raporda öncelikle genel bilgiler, paydaş kurumlarla görüşmeler ve 2018 programı verildiği (1-9 sayfa), 9-35. sayfalarda da ziyaret edilen alanlardaki mevcut durum, tespitler, varsa yapılması gerekenler, öneriler verildiği, bu kısımların görülebilir olması için sarı zeminle işaretlendiği, sadece ayrı bir dosya olarak verilen alanlara ait olan fotoğrafların, raporda her alanın sonuna eklendiğini açıklayan bir bilgi notu da dahil söz konusu rapor bu duruma göre revize edilerek tekrar proje yönetimine sunulmuştur.
- ✓ Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü'nün gerekçe raporlarına istinaden yapacağı çalışmalara yönelik bilgi için gönderdiği yazılar S-1B Danışmanları tarafından incelenerek görülen eksiklikleri tamamlamaları kaydıyla yapılacak çalışmanın uygun görüldüğüne dair cevabi yazılar hazırlanmıştır. (Ek-6)
- ✓ Trabzon Orman Bölge Müdürlüğünüz Bayburt Orman İşletme Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi ile ilgili olarak mikrohavza planında yer almayan, Çamlıköz, Çakırbağ, Yanıkçam, Karşıgeçit köylerinin proje kapsamına alınma talepleri ile ilgili görüş istenmiş, proje mikrohavzaları dışında olmaları nedeniyle uygun görülmemiştir. (Ek-7)
- ✓ TRGM tarafından Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında Bayburt ili sınırları içerisinde seçilmiş 2 mikrohavza sınırları içerisinde kalan ancak proje faaliyeti uygulanmayan köylerde gelir getirici faaliyetlerin uygulanmasının düşünüldüğü ve yerel birimlerden yapılan bu talebin Bakanlıklarınca uygun görüldüğü belirtilerek Proje Yönetiminin görüşü sorulmuş, bu konuda Proje Yönetimi söz konusu talebin uygun görüldüğü cevabi yazısını göndermiştir. (Ek-8)
- ✓ OGM Dış ilişkiler Eğitim ve Araştırma Dairesine yazdığımız, 26 Nisanda Hazine Müsteşarlığında yapılan yıllık değerlendirme toplantısı (portfolio toplantısı) sonuçları ile ilgili bilgilendirme yazısı yazılmıştır. (Ek-9)

- ✓ Artvin Orman Bölge Müdürlüğünün elektro şoklu tel çit mal alımına müsaade yazısı, fidanlık ek ödenek talebi ile dam örtülüğü uygunluk talebi yazıları ile Erzurum orman Bölge Müdürlüğünün araç kiralama talerbini uygun gören yazılar hazırlanarak ilgili Bölge Müdürlüklerine gönderilmiştir. (Ek-10)
- ✓ Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü Bayburt ili araç kiralama talebi, Yaylapınar köyünün mini hidroelektrik santrali talebi ile ilgi yazılar ile Yaylapınar köyünün ek faaliyet talebi yazıları cevaplanarak ilgili birimlere gönderilmiştir.(Ek-11)
- ✓ Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Eğitim kapasite Geliştirme faaliyeti kapsamında düzenlenmesi planlanan Fransa Teknik seyahati ile ilgili Fransa ONF'den ilgili kişilerle görüşülerek program tarih ve detayları belirlenmeye çalışılmıştır.
- ✓ Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi 2012-2017 yılı gerçekleştirmeleri tüm kurumlar itibarı ile güncellenerek Proje OGM sorumlusu ve ilgililere gönderilmiştir.
- ✓ Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında Artvin ve Erzurumda yapılan çalışmaları içeren el bilgi notları hazırlanarak Proje Müdürü ve ilgililere gönderilmiştir.(Ek-12)
- ✓ Danışman firmalardan gelen raporlar (aylık, üç aylık, altı aylık, yıllık raporlar) incelenmiş, ilgili yerlere ulaştırılmıştır.
- ✓ Proje Supervisor'ü ve S-1B Danışmanları olarak 2018 Mayıs ayı içerisinde yapılan toplantılarda proje faaliyetlerinin son durumları takibi yanında, Proje Müdürü, OGM sorumlusu ile proje faaliyetleri konusunda bilgi aktarımı ve görüşmeler yapılmış, Proje faaliyetlerini içeren Proje Tanıtım Kitapçığı, proje bilgi notu, proje slayt sunusu, yurt dışı eğitimler, proje illerine yapılan seyahat ve sonuçları, 2012-2017 yılları gerçekleştirmeleri, projenin genel uygulamaları, yıllık programlar ve yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir.
- ✓ Proje kapsamında yapılan seyahat, toplantı ve proje faaliyetleri derlenerek web sayfasına haber ve bilgi olarak konulmuştur.

2.2- Toplantılar, Seyahatler:

✓ **Proje Yönetimi ile toplantılar (Mayıs 2018):**

S-1 B danışmanları olarak Proje Müdürü, OGM sorumlusu ile proje faaliyetleri konusunda toplantılar yapılmış, proje tanıtım kitapçığı, proje bilgi notu, proje slayt sunusu, proje yurtdışı teknik eğitimleri, proje illerine yapılan seyahat ve sonuçları, 2012-2017 yılları gerçekleştirmeleri ile 2018 yılı programı ve uygulamalar görüşülmüştür.

✓ **JİCA Türkiye ile toplantı (PYB, S-1B Danışmanları/ 02, 09 Mayıs 2018):**

2 Mayıs 2018 tarihinde yapılan toplantıda proje uzun dönem ödeme tahminleri tablosu çalışmaları (Long Term Disbursement (LTD)) ile yurtdışı eğitimleri görüşülmüştür.

9 Mayıs 2018 tarihinde yapılan toplantıda, Proje durum raporu (PSR) ile yurtdışı eğitimleri görüşülmüştür.

✓ **S-1B Danışmanları toplantıları (Mayıs 2018):**

Proje Supervisor'ü ve S-1B Danışmanları ile 2018 Mayıs ayı içerisinde yapılan toplantılarda, Proje Tanıtım Kitapçığı, proje bilgi notu, proje slayt sunusu, yurt dışı eğitimler, proje illerine yapılan seyahat ve sonuçları, 2012-2017 yılları gerçekleştirmeleri, projenin genel uygulamaları, yıllık programlar ve yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir.

S-1 B danışmanları ile birlikte, PYB tarafından hazırlanması istenilen, Proje tanıtım kitapçığı için gereken Doğal kaynakları Korunması ve Rehabilitasyonu, Küçük Ölçekli Sulama Faaliyetleri ve Gelir Getirici Faaliyetlere ait, resim ve dökümantasyonun temin edilmesi faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

3- S-1B UZMANLARINCA 2018 YILINDA YAPILMASI PLANLANAN ÇALIŞMALAR

Proje Supervizörü (İzleme ve Değerlendirme Uzmanı), Havza Yönetimi Uzmanı, Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı ve Sulama Uzmanının görev tanımı, iş planı ve Proje Uygulama birimlerince ortak olarak hazırlanan “**Danışmanların Çalışma Esasları**” başlıklı ilkeler doğrultusunda, 2018 yılında yapacağı çalışmalar;

- Proje süpervizörlük/yönetim işlerinin yerine getirilmesi,
- Proje ile ilgili tüm dokümanların gerek duyulduğunda gözden geçirilmesi,
- Aylık, 3 aylık, altı aylık ve yıllık ilerleme raporlarının hazırlanması,
- JICA’ya sunulacak ilerleme raporlarının hazırlanmasında PM/PUB’ye yardımcı olunması,
- Proje Yönetimi, PYUB tarafından verilen konusu ile ilgili diğer görevlerin yerin getirilmesi,
- Proje Yönetim Birimi ve diğer danışmanlarla birlikte gerek merkez ve gerekse il ve havza düzeyinde yapılacak toplantılara, seminer, çalıştay vb. etkinliklere katılım sağlanması,
- Mikrohavza Planları kapsamında yürütülmekte olan uygulamaların havza yönetimi, izleme ve değerlendirme, gelir getirici faaliyetler ve sulama açısından uzmanlarca takip edilmesi; Proje Yönetim Birimi, İl Uygulama Birimleri ve ilgili taraflara yardımcı olunması ve gerektiğinde saha ziyareti ile faaliyetlerin incelenmesi, ilgili uzmanlarca teknik tavsiye ve önerilerde bulunulması,
- Proje kapsamında Doğal Kaynakların Korunması, Rehabilitasyonu ve Sürdürülebilir Yönetimi, gelir getirici faaliyetler ve sulama ile ilgili aktivitelerin, bunların Mikro Havza içindeki uygulama alanları, miktarları ve detaylarının ve her bir aktivite için dikkate alınması gereken kriterlerin belirlenmesi konularında teknik tavsiyelerde bulunulması,
- Proje paydaşları ve saha uzmanları, konu uzmanları, yerel gruplar, diğer uzmanlar ve İl Proje Uygulama Birimleri ile projeye yönelik görüşmeler yapılması, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesi, ilgili tarafların süreçle ilgili bilgilendirilmesi, çalışmaların değerlendirilmesi ve aktif katılımlarının sağlanması,
- S-1B ve S-3 Danışmanlıklarının 2018 yılı iş planlarının PYUB’nin koordinasyonunda Proje Uygulama Planı’na göre revize edilmesi,
- İzleme ve Değerlendirme faaliyetlerinin arazi ve diğer çalışmalarına katılım ve katkı ile yapılacak işlerin iş planlarına uygun yürütülmesinin sağlanması, elde edilen verilerin kontrolü, teknik destek ve yönlendirme yapılması,
- CBS tabanlı İzleme ve Değerlendirme Sistemi çalışmalarının izlenmesi ve gerektiğinde yönlendirmelerin yapılması, kurulan ve kurulacak olan sediment ve iklim istasyonları ile ilgili işlemlerin teknik ve idari yönden izlenmesi gelir getirici faaliyetlerin izlenmesi ve gerekli yönlendirmelerin yapılması,

- Proje amaç ve beklentileri doğrultusunda bölgedeki üniversiteler ve araştırma kuruluşları ile görüşmelerde bulunarak edinilen bilgilerin mikrohavza plan uygulamalarına yansıtılmasının sağlanması,
- TRGM tarafından tamamlanan “Pazar Araştırmaları ve Fizibilite Çalışması” sonuçlarının uygulamaya aktarılması konusunda teknik destek sağlanması,
- Sulama tesisi projelerinin inşasını yapacak olan Artvin ve Bayburt’ta İl Özel idareleri ile Erzurum’da DSİ Bölge Müdürlüğü ile müşterek çalışmalar yapılması, gerekli ödenek sağlanması ve uygulamaların Sulama Uzamanınca takip edilmesi,
- İzleme ve Değerlendirme Sistemi açısından sistemde yer alması gereken verilerin kurum ve kuruluşlardan temini ve sisteme uyumlu hale getirilmesinin sağlanması,
- Proje ile ilgili sağlanması gereken bilgilerin takibi, yönlendirmesi ve denetlemesi,
- İDS çalışmalarının MH planlarıyla uyum içinde yapılmasının sağlanması,

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi “Proje Yönetim Biriminde” tam zamanlı olarak görev alan Proje Asistanı/Tercüman Sekreter tarafından,

- Planlanmış olan toplantılarda ve seminerlerde ihtiyaç duyulduğunda gerek JICA ve gerekse diğer kurumlara sözlü çevirilerin yapılması (simultane, ardıl, fısıltı vb.),
- Toplantılar sonucunda ortaya çıkacak raporların ve dokümanların hedef dile yazılı çevirilerinin yapılarak JICA ve konuyla ilgili kurumların bilgilendirilmesi,
- JICA ile yapılacak resmi yazışmaların yazılı çevirilerinin Proje Yönetim Birimine iletilmesi ve bu sayede kurumlar arası iletişimin sürekliliğinin sağlanması,
- Proje kapsamında ortaya çıkacak olan belgelerin düzenli bir dosyalama yöntemi ile kurum içerisinde muhafaza edilerek Proje Yönetim Biriminin önemli belgelere ulaşabilmesinin sağlanması,
- Proje kapsamında çalışan uzmanlara, Bakanlık personeline, JICA temsilcilerine sözlü çeviri ve mihmandarlık yapılması, görevleri yerine getirilecektir.

Arz olunur. Haziran 2018

Ek-1: Mayıs 2018- Ağustos 2018 Kısa Dönem Ödeme Tahminleri tablosu

CORUH RIVER WATERSHED REHABILITATION PROJECT		
1. Investment Program Information		
Investment Program, Project Number	2011A050050	
Investment Program, Project Name	Coruh River Watershed Rehabilitation Project	
2. Disbursement Forecast		
Creditor	Japan International Cooperation Agency (JICA)	
The Amount of Credit	4.225.000.000,00 JPY	
Currency	JPY	
	2018, Disbursement Forecast	
	Consultancy	Civil Works and Capacity Development
Disbursement Forecast in May, 2018	0,00	0,00
Disbursement Forecast in June, 2018	20.000.000,00	160.000.000,00
Disbursement Forecast in July, 2018	0,00	150.000.000,00
Disbursement Forecast in August, 2018	10.000.000,00	140.000.000,00
Total	30.000.000,00	450.000.000,00

ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
(Mayıs 2018)

Ek-3: 2018 Nisan ayı Aylık Faaliyet Raporu

TOPRAK MUHAFAZA VE HAVZA ISLAHI DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2018 YILI NİSAN AYI YATIRIM NİTELİKLİ FAALİYETLER															
Sıra No	Faaliyet Grubu	İşin Adı	Faydası	Planlanan İşler			(Kümülatif)			Ay içindeki Gerçekleşen İşler			Açıklamalar	Değerlendirme	
				Birim	Miktar	Tutar Bin TL.	Miktar	Tutar Bin TL	%	Miktar	Tutar Bin TL	%		Müştaş Yardımcısı	Müştaş
1	Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi	Toprak Muhafaza Tesis	Toprak aşınım, taşınımını önleme	Ha	1.400	3.054	0	0	0,0	0	0	0,0			
		Toprak Muhafaza Bakım	Toprak aşınım, taşınımını önleme	Ha	13.434	1.916	0	0	0,0	0	0	0,0			
		Mera Islah	Toprak aşınım, taşınımını önleme Hayvancılığın gelişimi	Ha	250	382	0	0	0,0	0	0	0,0			
		Rehabilitasyon Tesis	ormanların iyileştirilmesi	Ha	1.784	3.411	0	0	0,0	0	0	0,0			
		Rehabilitasyon Bakım	ormanların iyileştirilmesi	Ha	3.474	824	0	0	0,0	0	0	0,0			
		Müşavirlik Hizmetleri	Danışman Hizmetleri Plan Yapımı			984	0	219	22,3	0	61	6,2			
		Eğitim	Kapasite Geliştirme	Adet	10	1.945	1	148	7,6	1	1	0,0			
		Orkôy Faaliyetleri				10.680	0	0	0,0	0	0	0,0			
		Taşıt Alımı		Adet	7	1.800	0	0	0,0	0	0	0,0			
		İş makinası alımı		Adet	15	4.104	0	0	0,0	0	0	0,0			
		Fidanlıkların iyileştirilmesi				1.300	0	0	0,0	0	0	0,0			
		TOPLAM					20.342	30.400	0	367	1,2	0	62	0,2	

Ek-4: Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi 2012-2019 programları ile 2012-2017 yılı gerçekleştirmeleri

A-Tabi kaynakların Korunması, Rehabilitasyonu ve Sürdürülebilir Yönetimi						
FAALİYET ADI	BİRİM	PROGRAM	GERÇEKLEŞME 2012-2017			
		2012-2019	TOPLAM	ARTVİN	BAYBURT	ERZURUM
			Miktar	Miktar	Miktar	Miktar
Toprak muhafaza tesis	Hektar	25.402	25.822	6.210	4.447	15.165
Bozuk Orman Rehabilitasyonu Tesis	Hektar	6.930	6.936	2.782	2.341	1.813
Mera ıslahı (Orman İçi)	Hektar	3.095	3.300	539	92	2.669
Mera ıslahı (Orman Dışı)	Hektar	16.667	18.709	4.979	1.431	12.299
Fidanlıkların iyileştirilmesi	Adet	3	3	2	1	
Çığ kontrol etüt ve müh. çalışmaları	Alan	3	2	0	0	2
B-Köylülerin Yaşamının/Geçiminin İyileştirilmesi						
FAALİYET ADI	BİRİM	PROGRAM	GERÇEKLEŞME 2012-2017			
		2012-2019	TOPLAM	ARTVİN	BAYBURT	ERZURUM
			Miktar	Miktar	Miktar	Miktar
Arcılığın geliştirilmesi (1ünite= 20 arılı kovan)	ünite	806	889	383	154	352
Elektro şoklu tel çit sistemi	adet	806	839	333	154	352
Sera kurulumu	adet	207	210	7	0	203
Güneş enerjili su ısıtma sistemi	adet	400	907	230	83	594
ısı yalıtımı, sobalı kalorifer sistemi	adet	35	182	75	39	68
ısı etken soba	adet	141	141	0	0	141
Güneş enerjili elektrik üretim paneli	Adet	16	16	0	0	16
Yem bitkisi üretimi	Dekar	33.200	23.903	1.410	5.250	17.243
Ahır şartlarının iyileştirilmesi	Adet	856	1.425	378	165	882
Meyveciliğin Geliştirilmesi (fidan)	Adet	200.000	75.215	12.783	17.180	45.252
Demonstratif meyve bahçesi kurulumu	Dekar	312	242	114	70	58
Sebzeciliğin geliştirilmesi(Fide)	Adet	582.600	422.304	70.000	23.304	329.000
Küçük ölçekli sulama altyapısının iyileştirilmesi (Erzurum)	Köy adet	33	11	0	0	11
Küçük ölçekli sulama altyapısının iyileştirilmesi (Artvin, Bayburt İÖİ)	Köy adet	42	37	23	14	0

Ek-5: Erzurum OBM toplu sera dalgıç pompa talebi

SAYI:

/05/2018

KONU: Toplu Seralar

DAĞITIM YERLERİNE

İLGİ: Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü'nün 02.05.2108 tarih ve E.945394 sayılı yazısı

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü İlgi'deki yazısı ile Uzundere İlçesi Altınçanak köyünde yapılan seralara su sağlayacak havuzun daha iyi su temini için yerinin değiştirilmesi nedeniyle dalgıç pompaya ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Söz konusu talebiniz Bölge Müdürlüğüne tahsis edilen 2018 yılı program ödeneklerinden karşılanmak üzere Proje Yönetimimiz tarafından uygun bulunmuştur.

Gereğini arz/rica ederim.

Fahrettin AY
Proje Müdürü
Daire Başkanı

Gereği:
ERZURUM ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Bilgi:
ORKÖY DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ek-6: Erzurum OBM yazışmaları

SAYI:

/05/2018

KONU: Gerekçe raporu

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NE

ERZURUM

İLGİ: 27.04.2018 tarih ve 67934607-160.01.01-E.898674 sayılı yazınız

İlgi yazınız eki gerekçe raporunda; *“Erzurum ili, İspir İlçesi, Aksu(Yedigöller) mahallesi sınırları içerisinde ÇNHRP kapsamında UC-17-14 kotlu sahada toprak muhafaza çalışması yapılmıştır. UC-17-14 kotlu sahada yapılan çalışma esnasında mera ıslahı gerekli görülmemiş olup daha sonra halkın talebi üzerine arazi etütü yapılarak mera ıslahı projesi yapımı uygun görülmüştür. ...”* denilmektedir.

Proje kapsamındaki UC-17-14 kotlu toprak muhafaza sahası Yıldıztepe Köyü sınırları içerisinde olup mera ıslahı projesi yapılan saha (Yedigöl Köyü, 101 ada 249 parsel) ile de ilgisinin bulunmadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca gerekçe raporunda mera ıslahı kapsamında yapılması planlanan faaliyetler sayılmış olmakla birlikte yatırım giderleri cetvelinde yer verilen “Canlı Hayvan Gölgeği” faaliyetine yer verilmediği görülmektedir.

Bu nedenlerle, uygulama yeri ve uygulanacak faaliyetler bakımından hatalı bir uygulamaya meydan verilmemesi amacıyla gerekçe raporunda gerekli düzeltmelerin yapılmasında fayda görülmektedir.

Ayrıca, Yatırım Giderleri cetvelinde (Çizelge: 8) taş temizliği (1901.1) faaliyetinin 383 hektar alanda yapılacağı belirtilmiş olup bu miktarın mera ıslahı yapılacak alanın tamamına tekabül ettiği anlaşılmaktadır. Taş temizliği yapılması planlanan alan miktarının teknik gereklilik ve mevcut ödenek yönünden yeniden değerlendirilmesinde fayda görülmektedir.

Planlanan mera ıslahı çalışması, **proje kapsamında daha önce çalışma yapılan alanlarla örtüşmemesi ve 2018 yılı ödenekleri çerçevesinde yapılması kaydıyla uygun** görülmüştür.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Fahrettin AY
Proje Müdürü
Daire Başkanı

SAYI:
KONU: Gerekçe raporu

/05/2018

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NE
ERZURUM

İLGİ: 27.04.2018 tarih ve 67934607-160.01.01-E.898206 sayılı yazınız

İlgi yazınız eki gerekçe raporunda; *“Erzurum ili, İspir İlçesi, Koç mahallesi sınırları içerisinde ÇNHRP kapsamında UC-17-14 kotlu sahada toprak muhafaza çalışması yapılmıştır. UC-17-14 kotlu sahada yapılan çalışma esnasında mera ıslahı gerekli görülmemiş olup daha sonra halkın talebi üzerine arazi etütü yapılarak mera ıslahı projesi yapımı uygun görülmüştür. ...”* denilmektedir.

Proje kapsamındaki UC-17-14 kotlu toprak muhafaza sahası farklı bir mikrohavzada olup mera ıslahı projesi yapılan saha (Koç köyü, 150 ada 1 parsel) ile de ilgisinin bulunmadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca gerekçe raporunda mera ıslahı kapsamında yapılması planlanan faaliyetler sayılmış olmakla birlikte yatırım giderleri cetvelinde yer verilen “Canlı Hayvan Gölgeliği” faaliyetine yer verilmediği görülmektedir.

Bu nedenlerle, uygulama yeri ve uygulanacak faaliyetler bakımından hatalı bir uygulamaya meydan verilmemesi amacıyla gerekçe raporunda gerekli düzeltmelerin yapılmasında fayda görülmektedir.

Planlanan mera ıslahı çalışması, **proje kapsamında daha önce çalışma yapılan alanlarla örtüşmemesi ve 2018 yılı ödenekleri çerçevesinde yapılması kaydıyla uygun** görülmüştür.

Fahrettin AY
Proje Müdürü
Daire Başkanı

SAYI:
KONU: Gerekçe raporu

/05/2018

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NE
ERZURUM

İLGİ: 27.04.2018 tarih ve 67934607-160.01.01-E.897801 sayılı yazınız

İlgi yazınız ve eki gerekçe raporundan; Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında İspir Mikrohavzası Çakmalı Köyü mevkiinde toprak muhafaza çalışması yapılan UC-14-23 nolu sahada ilave alt faaliyetlerin yapılmasının planlandığı anlaşılmaktadır.

Gerekçe raporunun incelenmesinden, rapor ekindeki eşik miktarı hesaplama tablosunda (Çizelge A) yer verilen “Temel Kazısı” pozuna yatırım giderleri cetvelinde yer verilmediği görülmektedir. Hatalı bir uygulamaya meydan verilmemesi amacıyla yatırım giderleri cetvelinde gerekli düzeltmenin yapılmasında fayda görülmektedir.

Planlanan çalışma, 2018 yılı ödenekleri çerçevesinde yapılması kaydıyla uygun görülmüştür.

Fahrettin AY
Proje Müdürü
Daire Başkanı

SAYI:
KONU: Gerekçe raporu

/05/2018

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NE
ERZURUM

İLGİ: 27.04.2018 tarih ve 67934607-160.01.01-E.898401 sayılı yazınız

İlgi yazınız ve eki gerekçe raporundan; Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında İspir Kuzey Mikrohavzası'nda (UC-17) Çamlıkaya Köyü mevkiinde 831,1 hektarlık sahada toprak muhafaza tesis çalışması yapılmasının planlandığı anlaşılmaktadır.

Gerekçe raporunun incelenmesinden, rapor ekindeki eşik miktarı hesaplama tablosunda (Çizelge A) yer verilen "Temel Kazısı" pozuna yatırım giderleri cetvelinde yer verilmediği görülmektedir. Hatalı bir uygulamaya meydan verilmemesi amacıyla yatırım giderleri cetvelinde gerekli düzeltmenin yapılmasında fayda görülmektedir.

Planlanan çalışma, 2018 yılı ödenekleri çerçevesinde yapılması kaydıyla uygun görülmüştür.

Fahrettin AY
Proje Müdürü
Daire Başkanı

Ek-7: Trabzon OBM ilave köy talep yazışmaları

SAYI:

/05/20187

KONU: Çoruh NHR Projesi kapsamına alınma talebi

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NE
TRABZON

İLGİ: 26.04.2108 tarih ve 88113864-622.01-E.887442 sayılı yazınız

İlgi yazınız ile Bölge Müdürlüğünüz Bayburt Orman İşletme Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi ile ilgili olarak mikrohavza planında yer almayan, Çamlıköz, Çakırbağ, Yanıkçam, Karşıgeçit köylerinin proje kapsamına alınma talepleri ile ilgili görüş istenmektedir.

Çoruh Nehri havzası rehabilitasyon projesi kapsamında Bayburt Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde seçilmiş 2 mikrohavza bulunmakta olup, bunlardan Masat mikrohavzası 2012-2013, Taht mikrohavzası 2013-2014 yıllarında planlanmış, bu aşamada mikrohavza sınırları içerisinde yer alan köylerde sorun tespiti, çözüm önerilerinin sunulmasına yönelik toplantılar, arazi ön etüdüleri ve detaylı arazi çalışmaları yapılmış, hangi köylerde hangi yıllarda, hangi çalışmaların yapılacağı belirlenmiştir.

2018 yılında Mardin'de yapılan çalıştayda, proje bütçesi göz önüne alınarak, **seçili mikrohavzaların (Masat, Taht) sınırları içerisinde kalan, ön çalışma yapılan ancak bütçe-maliyet gerekçesi ile proje faaliyeti uygulanamayan köylerde, 2018-2019 yılları için Proje Yönetiminden uygun görüş alınmak kaydı ile çalışma yapılabilceği** kararı alınmıştır.

Ekli haritadan da anlaşılacağı üzere, talep sahibi Çamlıköz, Çakırbağ, Yanıkçam, Karşıgeçit köylerinin seçili Masat ve Taht mikrohavzalarının sınırları içerisinde yer almadığı görüldüğünden proje çalışmalarına dahil edilmesi mümkün görülmemektedir. Bu nedenle söz konusu talepler uygun görülmemiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Fahrettin AY
Proje Müdürü
Daire Başkanı

EKİ: Proje mikrohavzaları ve köyleri haritası

Ek-8: TRGM ilave faaliyet talep yazışmaları

SAYI:

/05/20187

KONU: Çoruh NHR Projesi ilave talepler

**GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI'NA
(TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)**

İLGİ: 02.04.2108 tarih ve 80343608-730.06.02-E.966580 sayılı yazınız

Başka birimlere havale edilmesi nedeniyle Proje Müdürlüğümüze 2.04.2018 tarihinde ulaşan İlgili yazınız ile;

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında Bayburt ili sınırları içerisinde seçilmiş 2 mikrohavza sınırları içerisinde kalan ancak proje faaliyeti uygulanmayan köylerde gelir getirici faaliyetlerin uygulanmasının düşünüldüğü ve yerel birimlerden yapılan bu talebin Bakanlığınızca da uygun görüldüğü belirtilmektedir.

2018 yılında Mardin'de yapılan çalıştayda, proje bütçesi göz önüne alınarak, **seçili mikrohavzaların (Masat, Taht) sınırları içerisinde kalan, ön çalışma yapılan ancak bütçe-maliyet gerekçesi ile proje faaliyeti uygulanamayan köylerde, 2018-2019 yılları için öncelikle "doğal kaynakların rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetimi" çalışmaları** (toprak muhafaza, bozuk orman rehabilitasyonu ve orman içi veya orman dışı mera ıslahı) **yapılabilecek alanlar var ise Proje Yönetiminden uygun görüş alınmak kaydı ile çalışma yapılabileceği** kararı alınmıştır.

Bu doğrultuda söz konusu talep proje kapsamında verilmiş mevcut ödenekleriniz çerçevesinde yapılması kaydıyla Proje Yönetimince de uygun bulunmuştur.

Bilgilerinize arz rica ederim.

Yusuf ŞAHİN
Proje Koordinatörü
Genel Müdür Yardımcısı

Ek-9: OGM Dış İlişkiler DB Proje Yıllık Değerlendirme Toplantısı Bilgilendirme yazısı

SAYI:

/05/2018

KONU: Çoruh NHR Projesi JICA-Hazine Müsteşarlığı Toplantısı

**DIŞ İLİŞKİLER EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NA
ANKARA**

İLGİ: 11.04.2018 tarih ve 29106930-724.01.03-E.791162 sayılı yazınız

İlgi yazınız ile Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi ile ilgili olarak 26 Nisan 2018 tarihinde Hazine Müsteşarlığında JICA Türkiye Ofisinin de katılımı ile yıllık gözden geçirme toplantısı yapılacağı belirtilerek, hazırlıklı katılım sağlanması istenmişti.

Söz konusu toplantıya yönelik ekte verilen bilgi ve belgeler hazırlanarak katılmış ve projenin 2018 ve 2019 yılları ile ilgili gerekli mutabakat sağlanmıştır.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Fahrettin AY
Proje Müdürü
Daire Başkanı

EKİ: Proje Durum Belgeleri

Ek-10: OGM İller Proje 2018 faaliyetler talepleri yazışmaları

SAYI:

/05/2018

KONU: Çoruh NHRP elektro şoklu tel çit sistemleri alımı

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NE

ARTVİN

İLGİ: 03.05.2018 tarih ve 29925205-360.02.99-E.954533 sayılı yazınız

İlgi yazınız ile Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında 2018 yılında alınacak arılı kovanlar için gereken “elektro şoklu tel çit sistemleri” alımının 4734 sayılı kanun kapsamında açık ihale usulü ile yapılmasına onay verilmesi istenmektedir.

Söz konusu talebiniz Proje Yönetimince uygun görülmüştür. Ancak, Proje kapsamında Bölge Müdürlüklerinin verilen ödenek çerçevesinde yapacağı satınalmaların usul ve esasları Bölge Müdürlüklerimiz tarafından belirlenmekte olduğundan, ayrıca Proje Yönetiminden izin alınmasına gerek bulunmamaktadır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Fahrettin AY
Proje Müdürü
Daire Başkanı

SAYI:

/05/2018

KONU: Fidanlıkların iyileştirilmesi ödenek talebi

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NE

ARTVİN

İLGİ: 16.04.2018 tarih ve 98754429-841.02.01-E.821289 sayılı yazınız

İlgi yazınız ile Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında fidanlıkların iyileştirilmesi faslından 300.000 TL ödenek tahsis edildiği, ancak 2018 yılında yapılması planlanan çalışmalar için söz konusu ödeneğin yetmeyeceği belirtilerek, 151.000 TL ilave ödenek talep edilmektedir.

Söz konusu talebiniz uygun görülmüş olup, gerekli çalışmaların başlatılmasını, projenin bütün illere o faaliyet için verilen toplam ödeneğinin esas olduğu, söz konusu ödeneğin harcanması halinde ilave ödeneğin yıl içerisinde temin edilebileceği hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Fahrettin AY
Proje Müdürü
Daire Başkanı

SAYI:

/05/2018

KONU: Çoruh NHR Projesi Dam Örtülüğü ve 2018 revize programı

DAĞITIM YERLERİNE

İLGİ-a: Artvin Orman Bölge Müdürlüğü'nün 20.04.2108 tarih ve E.864667 sayılı yazısı

b: Orköy Daire Başkanlığı'nın 12.04.2018 tarih ve E.800 513 sayılı yazısı

c: Artvin Orman Bölge Müdürlüğü'nün 05.04.2108 tarih ve E.735560 sayılı yazısı

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü İlgı-c yazısı ile 2018 yılı Orköy faaliyetleri kapsamında verilmesi planlanan dam örtülüğünün İdare tarafından mal alımı şeklinde yapılarak hak sahiplerine "aynı" olarak verilmesi talep edilmiş, ancak Orköy Daire Başkanlığı ilgi-b'deki yazıları ile dam örtülüğü desteğinin aynı olarak yapılmasının uygun bulunmadığını, belirtilmiştir. Artvin Orman Bölge Müdürlüğü İlgı-a'daki yazıları ile bu konuda tekrar uygun görüş istemiştir.

Bilindiği üzere Proje Yönetimi olarak bir sonraki yılın ödenekleri ilgili birimlerle görüşmeler sonrasında miktar ve tutar olarak belirlenmekte ve ona göre projeden ödenek tahsisi yapılmaktadır.

2018 yılında Mardin'de yapılan çalıştayda, proje bütçesi göz önüne alınarak, varsa revize taleplerinin ve faaliyet miktar ve tutarlarındaki değişikliklerin, ilgili daire başkanlığından uygun görüş alınmak kaydı ile Proje Yönetim Birimine gönderilmesi, istenmişti.

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü ile Orköy Daire Başkanlığı arasında yapılan bir dizi yazışmada 2018 yılı programında talep edilen revize miktar ve tutarlar ile Orköy Dairesi Başkanlığınca uygun görülen miktar ve tutarlar arasında farklılıklar oluşmuştur.

Bu farklılıkları giderilmesi ve ilave ödenek talepleri ile ilgili tedbir alınabilmesi açısından;

- Artvin Orman Bölge Müdürlüğü'nce 2018 yılı bütçesinin halihazırda verilen ödenek çerçevesinde planlanan çalışmaların miktar ve tutarları ile revize kapsamında ilave ödeneklerle yapılması planlanan faaliyetlerin miktar ve tutarlarının Orköy Daire Başkanlığı ile mutabık kaldıktan sonra ayrı ayrı tablolar halinde Proje Yönetim birimine gönderilmesi,
- Orköy Daire Başkanlığı tarafından bu faaliyetlerin yapılmasının uygun görüldüğüne dair yazının Proje Yönetim birimine gönderilmesi,
- İlave ödenek taleplerinin söz konusu yazılarda belirtilmesi, hususlarında;

Gereğini arz/rica ederim.

Fahrettin AY
Proje Müdürü
Daire Başkanı

Gereği:

ORKÖY DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ERZURUM ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

SAYI:
KONU: Çoruh NHR Projesi araç kiralama

/05/2018

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NE
ERZURUM

İLGİ: 12.04.2018 tarih ve 15517396-869-E.803835 sayılı yazınız

İlgi yazınız ile Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında 2018 yılı Programı çerçevesinde İspir ve Oltu'da gerçekleştirilecek olan toprak muhafaza tesis, bakım, mera ıslahı, bozuk orman rehabilitasyonu ve diğer proje faaliyetlerinde kullanılmak üzere 2 adet arazi taşıtı (4x4 pikap) kiralanması talep edilmektedir.

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi bütçesinin ilgili faslından karşılanmak üzere söz konusu talebiniz uygun bulunmuş olup, çalışmaların zamanında gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması hususunda,

Gereğini rica ederim.

Fahrettin AY
Proje Müdürü
Daire Başkanı

Ek-11: Trabzon OBM Bayburt Proje 2018 faaliyetler talepleri yazışmaları

SAYI:

/05/2018

KONU: Mini Hidroelektrik santrali talebi

DAĞITIM YERLERİNE

İLGİ: Yaylapınar Köyü Muhtarlığı Azası Murat KALDIRIM ve arkadaşlarının dilekçesi,

İlgi dilekçe ile Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında yapılan çalışmalarda köyleri için 1 adet mini hidroelektrik santrali kurulumu saha tespiti yapıldığı, ancak bu güne kadar uygulamaya konulmadığı belirtilmekte ve uygulanması talep edilmektedir.

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında sadece Artvin için 1 adet, Erzurum için 1 adet olmak üzere 2 adet mini hidroelektrik santrali tesisi konulmuş, mikrohavza planlama aşamasında potansiyel saha tespit edilmesi için saha ölçümleri yapılması ve uygun şartları taşıyan saha bulunması halinde uygulanması belirtilmiştir. Projede mini hidroelektrik santrali kurulumu için öngörülen illerden olmamasına rağmen Bayburt ilinde de, yapılan planlama çalışmaları esnasında varsa uygun sahaların tespiti için söz konusu ölçümler yapılmıştır.

Ancak, Yaylapınar köyünün de içinde olduğu Masat Mikrohavzası da dahil olmak üzere 2012-2013 yıllarında planlanan mikrohavzalarda sulama uzmanı tarafından bir çok farklı sahada yapılan ölçümlerde projede yer alan kriterlere uygun saha bulunamamıştır. Bu nedenle gerek Yaylapınar köyü ve gerekse diğer ölçüm yapılan alanların hiç birinde herhangi bir projelendirme yapılmamış, söz konusu kaynak JİCA ve Proje Yönetiminin kararı ile projedeki başka faaliyetlere (gelir getirici, hayat şartlarını iyileştirici faaliyetler) aktarılmıştır.

Bilgilerinizi rica ederim.

Fahrettin AY
Proje Müdürü
Daire Başkanı

DAĞITIM;
TRABZON ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Murat KALDIRIM (Yaylapınar Köyü Muhtarlığı Azası / Yaylapınar Köyü Bayburt)

SAYI:

/05/2018

KONU: Çoruh NHR Projesi 2018-2019 faaliyetlerinden faydalanma

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NE
TRABZON

Yaylapınar Köyü Muhtarlığı Azası Murat KALDIRIM ve arkadaşlarının Proje Müdürlüğümüze verdiği bila tarihli dilekçesi ile Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında 2018 ve 2019 yıllarında verilecek desteklerden köylerinin yararlanmasını talep etmektedir.

Çoruh Nehri havzasında 162 köyün 97sinde proje faaliyetleri uygulanmakta, planlama yıllarına göre köylerde yapılacak faaliyetler belirlenmektedir. Yaylapınar köyünün de içinde olduğu Masat Mikrohavzasında 2012-2013 yıllarında planlama çalışmaları yapılmış, planlanan bu çalışmalardan Doğal kaynakların rehabilitasyonu (Toprak muhafaza, Bozuk orman rehabilitasyonu, mera ıslahı vb) çalışmalar 2013 yılından itibaren 2013 - 2014 ve 2015 yıllarında, hayat şartlarının iyileştirilmesi ve gelir artırıcı faaliyetler ise 2014 yılından itibaren 2014-2015 ve 2016 yıllarında uygulanmış, 2017 yılında da ödenekler çerçevesinde ilave çalışmalar olarak devam ettirilmiştir. Sonuç olarak, projedeki kaynak durumu göz önüne alınarak proje köylerinde bu çalışmalar devam ettirilmekte, her proje köyünün eşit ve dengeli yararlanması esas alınmaktadır.

Bu doğrultuda, söz konusu dilekçenin incelenerek gerekli cevabın verilmesi ve Proje Müdürlüğümüzün de bilgilendirilmesi hususunda,

Gereğini rica ederim.

Fahrettin AY
Proje Müdürü
Daire Başkanı

Eki: Dilekçe

SAYI:

/05/2018

KONU: Çoruh NHR Projesi araç kiralama

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NE

TRABZON

İLGİ: 18.04.2018 tarih ve 59547710-756.02-E.805179 sayılı yazınız

İlgi yazınız ile Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında 2018 yılı Programı çerçevesinde İspir ve Oltu'da gerçekleştirilecek olan toprak muhafaza tesis, bakım, mera ıslahı, bozuk orman rehabilitasyonu ve diğer proje faaliyetlerinde kullanılmak üzere ilave 1 adet arazi taşıtı (4x4 pikap) kiralanması talep edilmektedir.

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi bütçesi kapsamında 2018 yılı çalışmalarınız için müsaade verilmiş olan araçlar (1 adet minibüs, 3 adet arazi taşıtı) söz konusu çalışmalarınız için yeterli olduğundan talebiniz uygun görülmemiştir.

Gereğini rica ederim.

Fahrettin AY
Proje Müdürü
Daire Başkanı

Ek-12: Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında Artvin ve Erzurum Bilgi Notu

Bu Güne Kadar Artvin ili
Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Faaliyetleri

Ödenek (TL)	Harcama(TL)
22 milyon 929 bin	15 milyon 759 bin (OGM)
6 milyon 590 bin	6 milyon 979 bin (İÖİ)
2 milyon 575 bin	2 milyon 575 bin (TRGM)
32 milyon 094 bin	25 milyon 313 bin (TOPLAM)
Yapılan İşler	
<p>Artvin ilinde,</p> <ul style="list-style-type: none">• 6.210 ha toprak muhafaza ağaçlandırma• 7.410 ha toprak muhafaza bakım• 2.782 ha alanda bozuk orman rehabilitasyonu• 2.599 ha alanda rehabilitasyon bakım• 5.518 Ha (539 ha orman içi, 4.979 orman dışı) mera rehabilitasyonu çalışması olmak üzere, <p>Toplam 14.510 ha tesis, 10.099 ha bakım çalışması gerçekleştirilmiş,</p> <ul style="list-style-type: none">• Ardanuç ve Şavşat Orman Fidanlıklarında Fidanlıkların iyileştirilmesi çalışması yapılmıştır. Bu çalışmalar için 7 milyon 918 bin TL harcanmıştır.• Gelir artırıcı faaliyetler kapsamında,<ul style="list-style-type: none">- 383 ünite (7.660 adet) arılı kovan alımı ve dağıtımı, yapılmıştır.- Arıları yaban hayvanı zararından korumak için 350 adet elektroşoklu tel çit sistemi verilmiştir.- 7 adet sera tesisi,- 230 adet güneş enerjili su ısıtma sistemi tesisi,- 75 adet ısı yalıtımı (mantolama) ile 75 eve katı yakıtlı kat kaloriferi sistemi yapılmıştır. <p>Toplam 695 haneye 7 milyon 746 bin TL yardım yapılmıştır. Her aileye ortalama 11 bin 145 TL tamamı hibe yardım yapılmıştır.</p> <ul style="list-style-type: none">• Artvin İl Özel İdaresi tarafından 18 köyde (6 milyon 590 bin TL) ödenek ile küçük ölçekli sulama altyapısının iyileştirilmesi çalışmaları yapılmış, bu güne kadar 6 milyon 979 bin TL harcama yapılmıştır.• Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yem bitkisi dağıtımı, ahır iyileştirme, demonstratif meyve bahçesi kurulumu, orman dışı mera rehabilitasyonu çalışmaları gerçekleştirilmiş, 2 milyon 575 bin TL harcanmıştır.	

Bu Güne Kadar Erzurum ili
Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Faaliyetleri

Ödenek (TL)	Harcama(TL)
43 milyon 986 bin	27 milyon 080 bin (OGM)
6 milyon 271 bin	6 milyon 456 bin (DSİ)
6 milyon	5 milyon 447 bin (TRGM)
56 milyon 257 bin	38 milyon 983 bin (TOPLAM)

Yapılan İşler

Erzurum ilinde,

- 15.165 ha toprak muhafaza ağaçlandırma
 - 10.779 ha toprak muhafaza bakım
 - 1.813 ha alanda bozuk orman rehabilitasyonu
 - 532 ha alanda rehabilitasyon bakım
 - 14.968 Ha (2.669 ha orman içi, 12.299 orman dışı) mera rehabilitasyonu yapılmıştır.
 - **Toplam 31.946 ha tesis, 11.311 ha bakım yapılmıştır.**
 - Bu çalışmalar için **15 milyon 285 bin TL** harcama yapılmıştır.
 - Gelir artırıcı faaliyetler kapsamında,
 - 352 ünite (7.040 adet) arılı kovan alımı ve dağıtımı, yapılmıştır.
 - Arıları yaban hayvanı zararından korumak için 352 adet elektroşoklu tel çit sistemi verilmiştir.
 - 203 adet sera tesisi,
 - 594 adet güneş enerjili su ısıtma sistemi tesisi,
 - 68 adet ısı yalıtımı (mantolama) ile 68 eve katı yakıtlı kat kaloriferi sistemi,
 - 141 adet ısı etken soba,
 - 16 adet güneş enerjili elektrik üretim paneli yapılmıştır.
 - **Toplam 1.374 haneye 11 milyon 883 bin TL** yardım yapılmıştır. **Her aileye ortalama 8 bin 648 TL tamamı hibe** yardım yapılmıştır.
- İzleme ve Değerlendirme Sisteminin kurulması kapsamında **2 adet sediment ölçüm istasyonu** ile **2 adet meteorolojik ölçüm istasyonu** kurulmuştur.
- DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Uzundere ve Olurda nehir sedimentasyonu ve taşkın önleme çalışmaları ile 11 köyde (6 milyon 271 bin TL) ödenek ile küçük ölçekli sulama altyapısının iyileştirilmesi çalışmaları yapılmış, bu güne kadar 6 milyon 456 bin TL harcama yapılmıştır.
 - Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yem bitkisi dağıtımı, ahır iyileştirme, demonstratif meyve bahçesi kurulumu, orman dışı mera rehabilitasyonu çalışmaları gerçekleştirilmiş, 5 milyon 447 bin TL harcanmıştır.

2014 -2017 yılları arasında ÇNHRP kapsamında Yusufeli İlçesi Yusufeli ve Bıçakçılar Mikro Havzalarında,

- 193 aileye Arılı Kovan ve Elektroşoklu Çit Sistemi,
 - 119 aileye Güneş Enerjisi ile Su Isıtma Sistemi,
 - 7 aileye Sera Tesisi,
 - 6 aileye Çok Amaçlı Isınma Sistemi- Isı Yalıtımı,
- 325 aileye toplam 3.574.000,42 TL tamamı hibe kredi verilmiştir.

2014 -2017 yılları arasında ÇNHRP kapsamında Artvin ilimizde ,

- 273 aileye Arılı Kovan ve Elektroşoklu Çit Sistemi,
 - 222 aileye Güneş Enerjisi ile Su Isıtma Sistemi,
 - 7 aileye Sera Tesisi,
 - 3 aileye Orkøy Demontrasyonu,
 - 9 aileye Çok Amaçlı Isınma Sistemi- Isı Yalıtımı,
 - 60 aileye Arı Kovanı ve Elektroşoklu Çit Sistemi,
 - 33 aileye Isı Yalıtımı (İç Mantolama) ve Katı Yakıtlı Kat Kaloriferi Sistemi,
 - 33 aileye Isı Yalıtımı (Dış Mantolama) ve Katı Yakıtlı Kat Kaloriferi Sistemi,
- 640 aileye toplam 7.725.806,46 TL tamamı hibe kredi verilmiştir.

2018 yılında ÇNHRP kapsamında Yusufeli İlçesi Yusufeli ve Bıçakçılar Mikro Havzalarında,

- 29 aileye Arılı Kovan ve Elektroşoklu Çit Sistemi,
- 192 aileye Dam Örtülüğü,
- 221 aileye toplam 1,266,065 TL tamamı hibe kredi verilecektir.

2018 yılında ÇNHRP kapsamında Artvin İlimizde,

- 79 aileye Arılı Kovan ve Elektroşoklu Çit Sistemi,
 - 212 aileye Dam Örtülüğü,
- 291 aileye toplam 2.789.000 TL tamamı hibe kredi verilecektir.
